

نـوّار
Nawar

T32

مشروع
Project



PROGRESS
REPORT

August

2025

أغسطس

٢٠٢٥

تقرير
الإنجاز
الشهري

موقع المشروع :
بوشهر - غلا العرفان

الأعمال المنجزة Work Performed

- 1 أعمال الطابوق: تم الانتهاء منها.
Block work completed
- 2 اللياسة الداخلية: قيد التنفيذ بنسبة 70%.
Internal Plaster work is on progress 70%
- 3 أعمال البلاط: قيد التنفيذ بنسبة 40%.
Tile work is on progress 40%
- 4 اللياسة الخارجية: قيد التنفيذ بنسبة 20%.
External Plaster is on progress 20%



5194.4 م²
مساحة البناء



نسبة اكتمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%60

%100

مقاول المشروع
تثمين للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project




لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



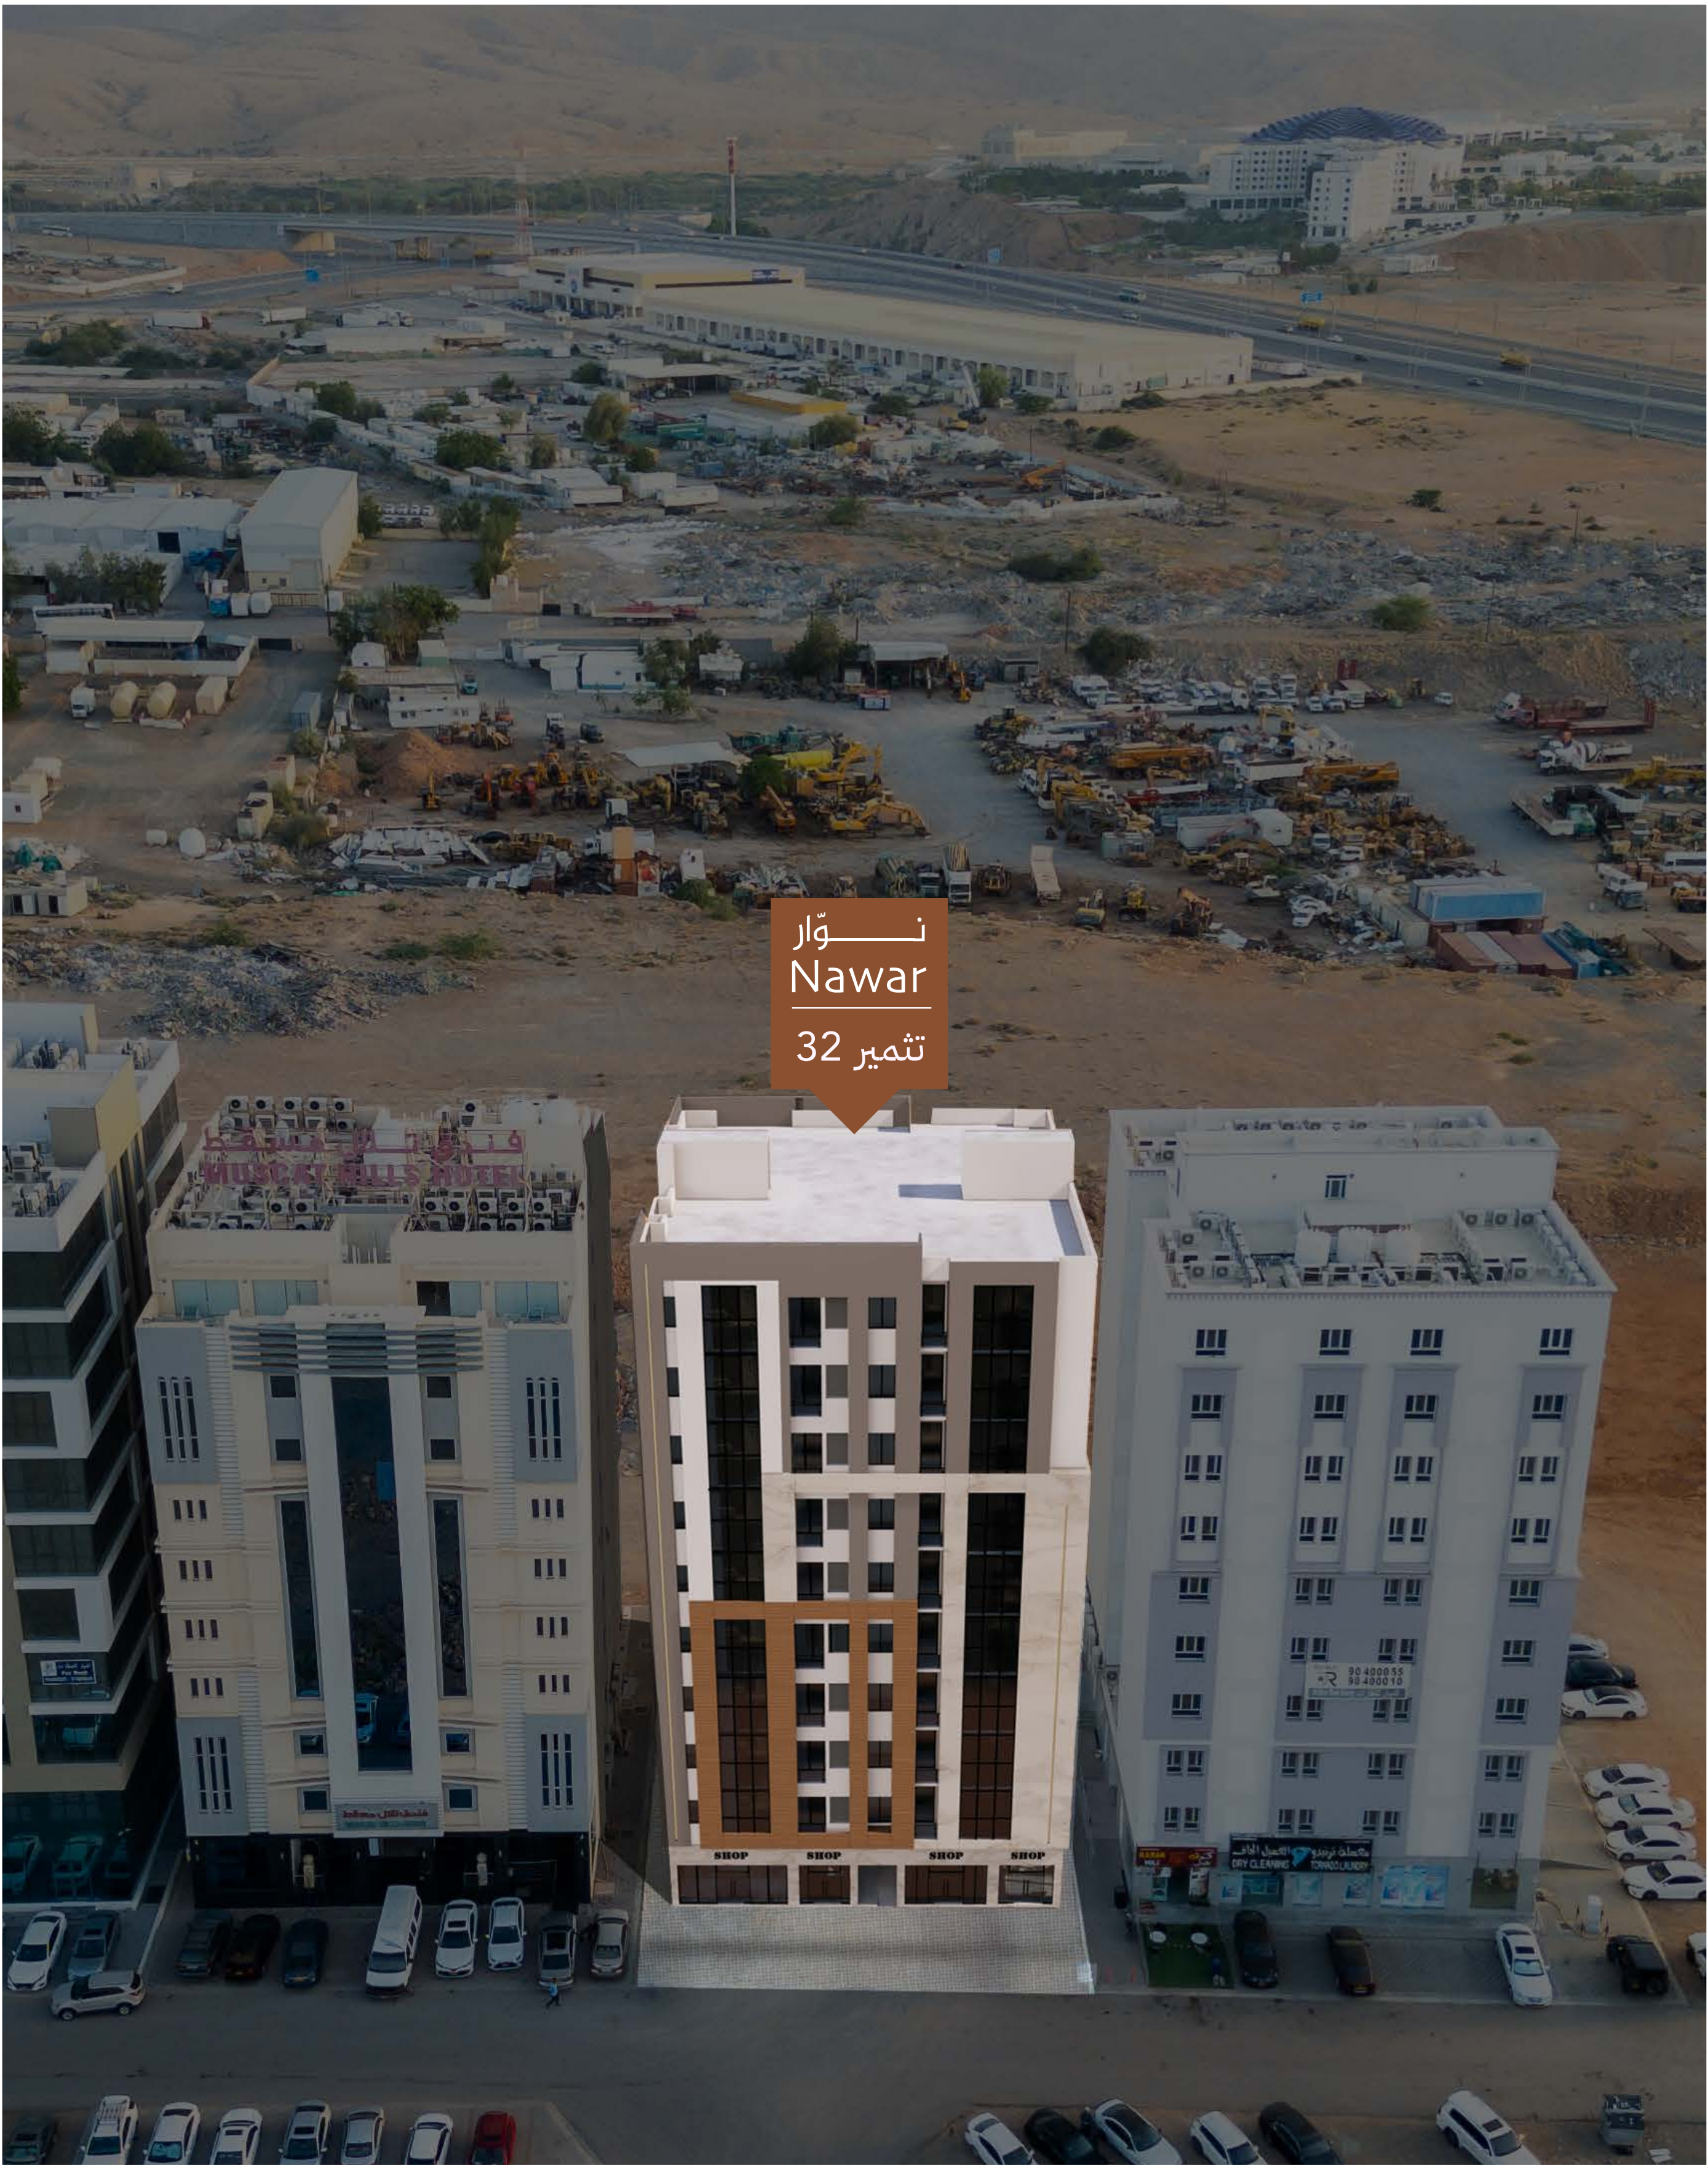

11 دقيقة إلى
مطار مسقط الدولي



MUSCAT HILLS
GOLF & COUNTRY CLUB

12 دقيقة إلى
مسقط هيلز



5 دقائق إلى
الشارع السريع



11 دقيقة إلى
عمان مول

بوشـر - غـلا

تتمير للمشاريع
الشاملة



مقاول
المشروع

تتمير العقارية



المطور
العقاري

يونيو 2026



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم

Thanks for your Trust



SCAN ME
