



ديما

T35

مشروع
Project



PROGRESS REPORT

February
2026

فبراير
٢٠٢٦

تقرير الإنجاز الشهري

موقع المشروع :
غلا العرفان

الأعمال المنجزة

Work Performed

الهيكل الإنشائي تم الانتهاء منه
Structure work completed

1

أعمال الطابوق قيد التنفيذ بنسبة 85%
Block work is on progress 85%

2


اللياسة الداخلية قيد التنفيذ بنسبة 50%
Internal plaster work is on progress 50%

3

أعمال البلاط قيد التنفيذ بنسبة 10%
Tile work is on progress 10%

4

6338.4 م²
مساحة البناء

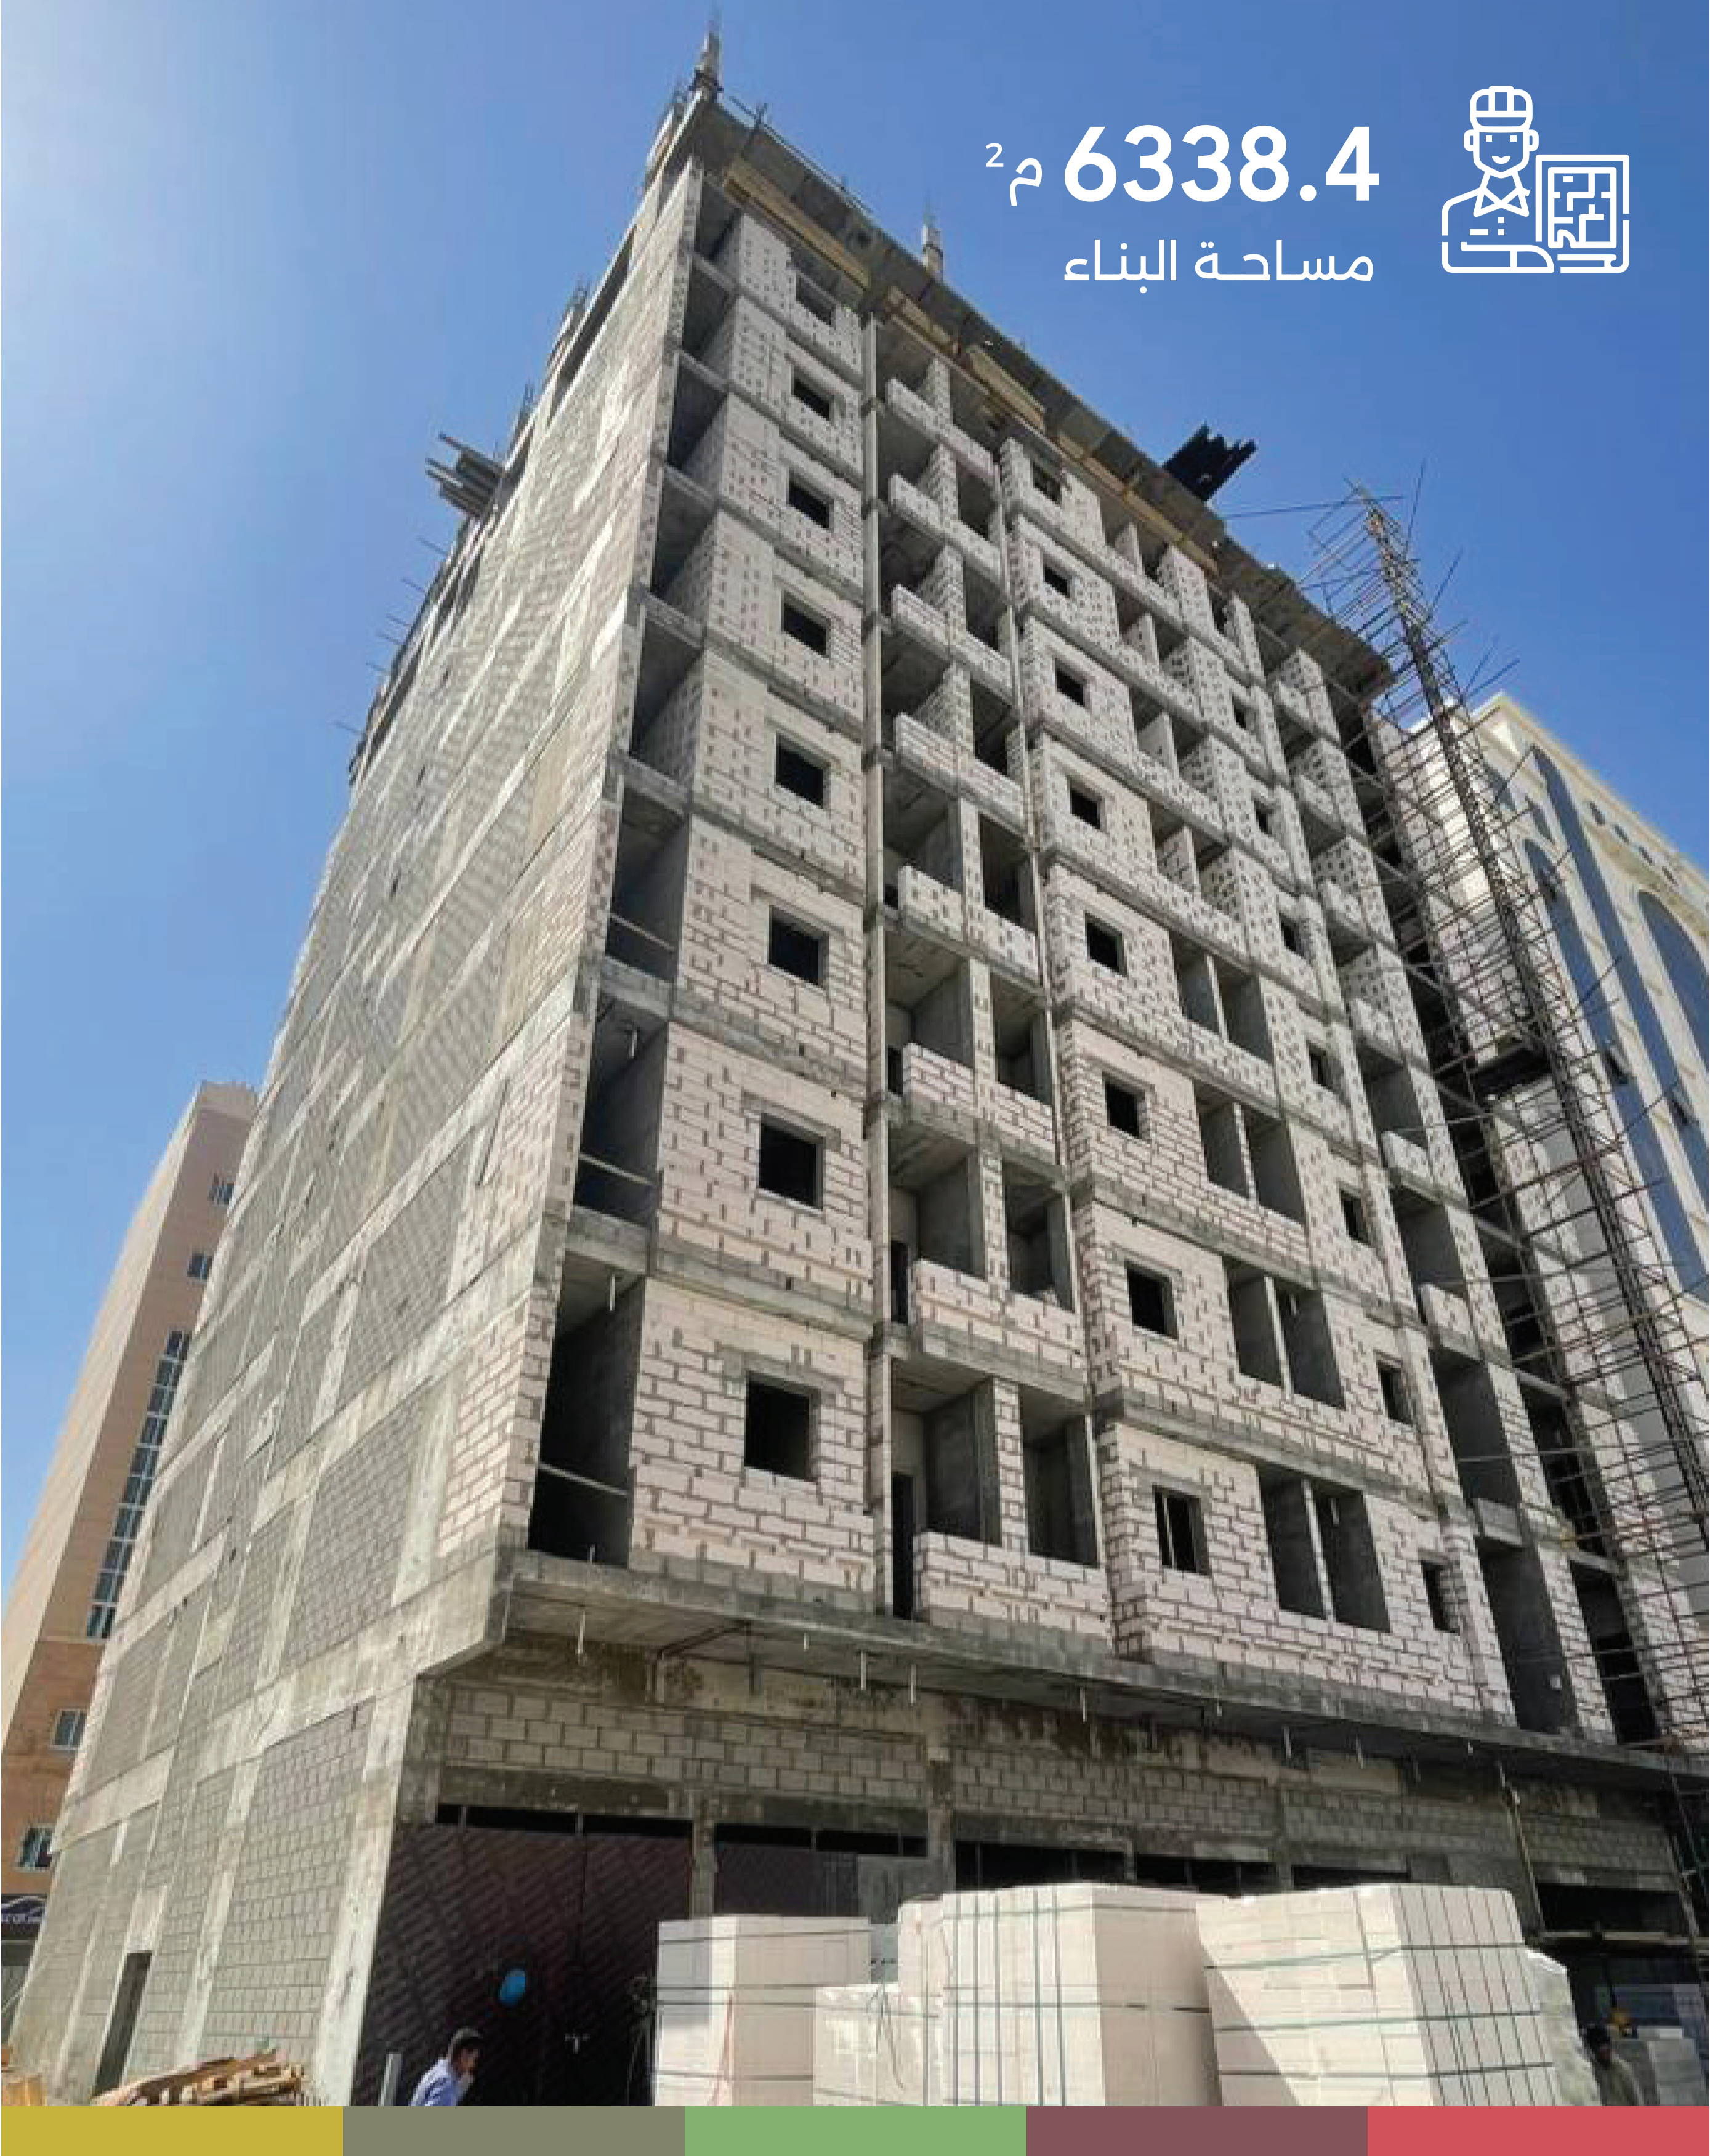

نسبة اكمال المشروع
PROGRESS PERCENTAGE



%43

مقاول المشروع
تتمير للمشاريع الشاملة



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project



لقطات من تطوّر الأعمال الإنشائية في المشروع
Shots of Construction Progress on the Project





ديها



09 دقائق إلى
مطار مسقط الدولي



5 دقائق إلى
مسقط جراند مول



5 دقائق إلى
الشارع العام



8 دقائق إلى
مول عُمان

غلا - العرفان
Gala - Al-Irfan

تتمير للمشاريع
الشاملة



مقاول
المشروع

تتمير العقارية



المطور
العقاري

ديسمبر 2026



تسليم
المشروع

شكراً لثقتكم
Thanks for your Trust



SCAN ME
